

Grantul ROU-T-MoH

Primitor Principal: Ministerul Sanatatii

Sub-recipient: Romanian Angel Appeal

Finantator: Fondul Global de Lupta Impotriva SIDA, Tuberculozei si
Malariei

Activitati implementate de Fundatia Romanian Angel Appeal (RAA)


Update Q5

Trimestrul 5 al grantului corespunzator perioadei
Octombrie – Decembrie 2019



4.1.1 – Dezvoltarea modelului integrat de servicii integrate in comunitate

A 4.1.1 – Dezvoltarea unui model de servicii integrate in comunitate



4.1.1 – Componenta privind

Continuarea serviciilor de reducere a riscurilor in randul CDI

CONTEXT

- Activități de reducere a riscurilor implementate in cadrul proiectului de catre ARAS – Sub-sub recipient al RAA*:
 - schimb de seringi, testare rapidă pentru HIV, HBV, HCV, distribuirea de prezervative, îngrijirea rănilor provocate de injectare și a abceselor, vaccinare pentru hepatita A și B;
- Informare, referire și însoțire la servicii medicale si sociale specializate
- Evaluarea riscurilor TB si referirea beneficiarilor (suspectilor de TB) catre unitati medicale specializate pentru diagnosticare si respectiv, tratament.

** Acord de sub-sub-finantare semnat in martie 2019*

4.1.1 – Componenta privind

Continuarea serviciilor de reducere a riscurilor in randul CDI

UPDATE Q5 Monitorizare proiect implementat de ARAS:

- În prezent activitatea continuă, echipele mobile ale ARAS ies constant in teren si furnizează servicii de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri injectabile.
- Tintele aferente trimestrului Q5 al grantului/Q4 pentru proiectul ARAS, au fost depasite (cf. *tabelului de pe urmatorul diapozitiv*).

4.1.1 – Monitorizare proiect ARAS

Gradul de realizare al indicatorilor

Indicatori (denumire)	Tiță trimestrială	Rezultat trimestrial	Rezultat cumulativ Q4	Tinta cumulativa Q4
Nr. de CDI care vor beneficia de pachetul minim de servicii (informare, educație și consiliere HIV, HVB, HVC, TBC), prezervative și schimb de seringi)	400	305	1749	1400
Nr. de seringi distribuite către CDI	350,000	192,630	617,720	950,000
Nr. de prezervative distribuite către CDI	39,200	37,298	127,576	106,400
Nr. de teste HIV efectuate	235	26	337	640
Nr. de teste HVB efectuate	350	26	325	950
Nr. de teste HVC efectuate	350	25	307	950
Nr. de CDI referiți/însoțiți la servicii medicale și sociale	90	118	246	300

^[1] Rezultatul trimestrial se refera la numarul de beneficiari unici care au primit serviciul respectiv pe parcursul trimestrului de raportare sau de materiale distribuite in aceeasi perioada; numarul de beneficiari care au primit serviciul respective pentru prima data se determina facindu-se diferenta dintre numarul cumulativ de beneficiar la finalul trimestrului de raportare si numarul cumultiv care au primit serviciul la finalul trimestrului anterior.

^[2] Cantitatea de prezervative disponibile in cadrul proiectului la momentul primei transe a fost de 50.000 de bucati. Aceasta cantitate a fost depasita, numarul suplimentar fiind asigurat din resurse proprii ARAS.

Foto: ARAS, imagini din proiect



4.1.1 – Componenta re. Dezvoltarea unui model de servicii integrate

SCOP:

Dezvoltarea unui centru de excelență în comunitate, prin parteneriatul cu PMB – ASSMB, MS și ONG, care să furnizeze servicii medico-psiho-sociale integrate pentru grupurile vulnerabile la HIV TB, Hep. virale din București (consumatori de droguri injectabile, persoane fără adăpost) și continuarea serviciilor de reducere a riscurilor.



la, tratament, testare



Tratament substitutiv



Adapost temporar



Schimb de seringi



Activitati de



Consiliere sociala



Consiliere psihologi

4.1.1 – Componenta re. Dezvoltarea unui model de servicii integrate

Context:

- Ideea centrului a apărut în 2017 ca urmare a mai multor activități de advocacy derulate de RAA în cadrul grantului FG anterior (ROU-T-RAA), inclusiv a unei vizite de studiu în Portugalia organizată de RAA pentru parlamentari din comisia de sănătate a Cam. Dep., PMB, advocates.
- Astfel, în 2018, RAA a reușit să aducă împreună actori relevanți, într-un parteneriat multisectorial semnat de către: Ministerul Sănătății, Primăria Municipiului București – prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale ale Mun. București, Spitalul Sf. Stelian, Spitalul Clinic “Victor Babeș”, Asociația Română Anti-SIDA, Asociația Carusel, Romanian Harm Reduction Network
- Ca urmare a acestui parteneriat, Centrul a fost introdus de către ASSMB în strategia de dezvoltare 2019-2020, Strategie ce a fost votată de către Consiliul General al Mun. București.

4.1.1 – Dezvoltarea unui model de servicii integrate (Centrul de excelență)

Context:

- Actualul grant ROU-T-MoH nu asigură suport financiar pentru infiintarea/dezvoltarea centrului, însă poate oferi asistență tehnică prin A. 2.1.1 c), în vederea elaborării de norme și politici necesare operaționalizării acestuia.
- Blocajul major in perioada Q1 – Q4 a constat în identificarea de catre PMB a unui spațiu adecvat pentru dezvoltarea centrului si respectiv, identificarea unor sume de bani în vederea achiziționării unui spațiu nou/renovării și amenajării acestuia.

4.1.1 – UPDATE Q5

- La propunerea RAA, MS a transmis in 22.11.2019 catre PMB-ASSMB o solicitare oficiala cerand informatii despre stadiul proiectului.
- In 29.11.2019 ASSMB a invitat toti partenerii la o intalnire de lucru, la care a fost comunicata adresa cladirii identificate si faptul ca PMB a contractat firma de arhitectura pentru realizarea documentatiei pentru realizarea lucrarilor de investitii (DALI).
- Ulterior intalnirii, documentatia a fost transmisa de catre firma de arhitectura contractata de PMB, tuturor partenerilor, in vederea completarii cu informatii (*studiul DALI completat in google docs cu contributia RAA, captura in diapozitivul urmator*)

4.1.1 – UPDATE Q5 – Studiu DALI

The screenshot shows a Google Docs interface. The document title is "studiu de fezabilitate_V 1". The left sidebar contains a table of contents with the following items:

- Cap. 2 - Situația existentă și nece...
- 1. Centre identice sau asemănă...
- 2. Categoriile de utilizatori / pacie...
- 3. Proceduri medicale / sociale
- 4. Situația cabinetelor / pct de ...
- Cap. 2.3 - analiza situației existen...
- Nr. existent utilizatori / pacienti
- Cap. 2.4 - Prognoze pe terme...
- Număr preconizat utilizatori / p...
- Cap. 2.5 - Obiective preconizate a...
- Cap. 4.4 - Sustenabilitatea realiza...
- Reintegrarea în societate
- Impactul social
- Egalitatea de șanse
- Resurse:

The main content area displays the following text:

Cap. 2 - Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului

1. Centre identice sau asemănătoare existente sau nu

Centrul medico-social pentru persoane din grupuri vulnerabile va funcționa în subordinea autorității locale, respectiv a Primăriei Municipiului București, în conformitate cu prevederile Ordonanței de guvern nr. 70 din 29 august 2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local. Astfel:

Art.5 indice 1. Beneficiarii serviciilor acordate în unitățile de asistență medico-socială sunt persoane cu afecțiuni cronice care necesită, permanent sau temporar, supraveghere, asistare, îngrijire, tratament și care, datorită unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să își asigure nevoile sociale, să își dezvolte propriile capacități și competențe pentru integrare socială.

La finalul anului 2017, potrivit preambulului la ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 87 din 29 noiembrie 2017, "la nivel național, numărul unităților de asistență medico-socială era relativ mic, respectiv 69 de unități totalizând un număr de 3.234 paturi". În Municipiul București a fost identificat un singur astfel de centru, în subordinea Primăriei Sector 4^[1].

Centrul medico-social este menționat în Strategia pentru Sănătate a Municipiului București 2018-2020, aprobată prin Hotărârea CGMB 696 / 18.10.2019, art. VI, pct. 3 și face obiectul Acordului de Parteneriat înregistrat la AMMSB cu nr. 6865 / 17.04.2018, semnat între Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, Ministerul Sănătății, Centrul de Evaluare și Tratament a Toxicodependențelor pentru Tineri Sf. Stelian București, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale "Dr. Victor Babeș", Fundația Romanian Angel Appeal, Asociația Română Anti-Sida, Asociația Carusel și Asociația RHRN - Romanian Harm Reduction Network. Centrul se inscrie și în prioritățile exprimate în cadrul Strategiei Naționale de Sănătate (2013-2020), respectiv OS 2.4 Reducerea incidenței bolilor transmisibile prioritare: HIV/SIDA și asigurarea accesului națienților la tratamente antivirale:

A 5.2.1 – Creșterea capacității autorităților publice locale și a organizațiilor nonguvernamentale din cinci județe de a răspunde adecvat nevoilor re. TB și TB-HIV

A5.2.1 UPDATE Q5

Am organizat prima serie de **ateliere de lucru de informare, formare si planificare** cu reprezentanti ONG si autoritati locale si de sanatate.

Atelierele au durat cate doua zile in fiecare judet, urmand sa organizam o a doua serie de ateliere in 2020.

- Cele 5 ateliere au avut loc astfel:
 - 24-25 octombrie la Bacău
 - 30 – 31 octombrie la Craiova (Dolj)
 - 14-15 noiembrie la Constanța
 - 20-21 noiembrie la Iași
 - 4-5 decembrie la Arad
- Numarul de participanti cumulativ din cele 5 judete = 128 persoane, dintre care:
 - 88 persoane sunt reprezentanti din institutii publice
 - 40 persoane sunt reprezentanti din ONG

A5.2.1 UPDATE Q5

Continuare (atelier de lucru):

In cele doua zile de lucru, participantii:

- au discutat despre nevoile pacientilor cu TB si HIV
- au facut o analiza de nevoi si de resurse
- au trecut printr-un proces de planificare a unei campanii de sanatate publica si au realizat un prim draft al campaniilor din 24 martie 2020.

La finalul trimestrului 5 rezultatele obtinute sunt:

- 5 sesiuni de lucru organizate
- 5 rapoarte de curs elaborate
- 5 rapoarte de analiza privind nevoile de asistenta tehnica elaborate
- 5 planuri de campanie – 24 Martie 2020 – ”Ziua Mondiala de Lupta Impotriva Tuberculozei”- dezvoltate
- 5 rapoarte realizate de agentia care a organizat atelierle



Foto: Ateliere de lucru cu institutii si ONG-uri organizate in trimestrul 5



Foto: Ateliere de lucru cu institutii si ONG-uri organizate in trimestrul 5

NEVOI

- PREVENȚIE** - STRATEGII - LOCALE (TL) Județene, Naționale
 PROMILAXIE PRIMARA, SECURIZAREA și REABILITARE
 IDENTIFICAREA GRUPURILOR VULNERABILE (TS) PENTRU PREVENȚIE ȚINTITĂ
 - PROGRAME / CAMPANII PROMOVĂRI cu ADREȘABILITATE (TM) GRUPURI POPULAȚIA GENERALĂ
 - EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE (Școli, LICEE, UNIVERSITĂȚI) (TL)
 - RESURSA UMANĂ DIN DOMENII DE SPECIALITATE

- TRATAMENT** (TS) Medicamentos (TS) Informal / Medicină (MD) / AS / KT / PSIHLOG (TL) / TO
 - ECHIPĂ MULTIDISCIPLINARĂ PRIMĂRII (AUTORITĂȚI LOCALE) / MISERICORDIE
 - EDUCAȚIE PACIENT PT. LIMBĂ
 - EXPLICATĂ KIAS NOȘTRĂ, PROMOVĂRE
 - PREDICȚIE / PREDICȚIBILITATE PT. NEVOIA DE MEDICAMENTE (TS) → (TL)
 - Comunicare Interumans specializată Asistent (TS) / Encourage

- REFERIRE** - PROGRAME DE EDUCAȚIE / INFORMARE A POTENTIALILOR IDENTIFICATORI și PERSONELAR cu RISC (TL) (TL)
 FAMILII
 EDUCATOR
 POLITIE

Foto: Ateliere de lucru cu institutii si ONG-uri organizate in trimestrul 5





Foto: Ateliere de lucru cu institutiile si ONG-uri organizate in trimestrul 5



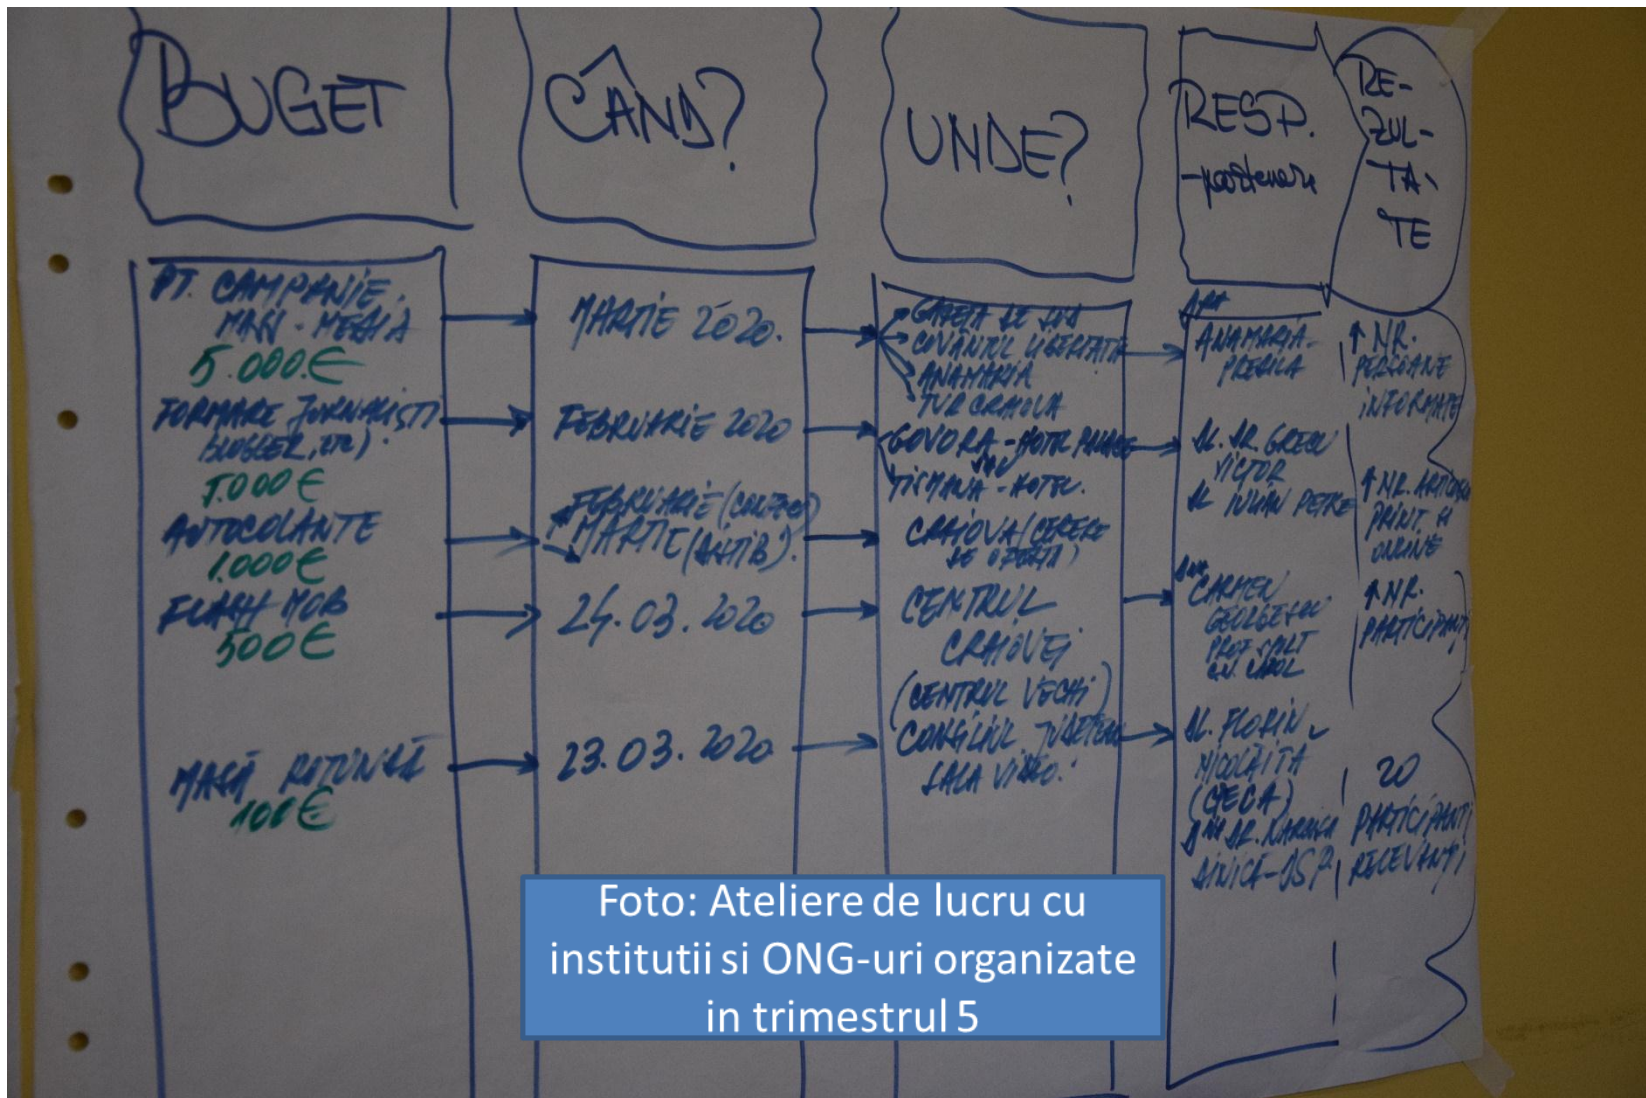


Foto: Ateliere de lucru cu institutiile si ONG-uri organizate in trimestrul 5

Foto: Ateliere de lucru cu institutii si ONG-uri organizate in trimestrul 5



A5.2.1 – Planificare Q6:

Realizarea platilor pentru facilitatori si organizarea evenimentelor (efectuata)

Realizarea unui centralizator cu materiale si solicitarea de oferte de pret pentru materialele necesare campaniei din 24 Martie (efectuata)

Contractarea si realizarea designului si a materialelor necesare (flyere, postere, tricorui, pin-uri, etc.)

Vizite si intalniri de follow-up cu participantii de la sesiuni, pentru planificarea in detaliu a campaniilor de la nivel local astfel:

- 31 ianuarie la Iasi
- 3 februarie la Bacau
- 7 februarie la Craiova
- 13 februarie la Constanta
- 21 februarie la Arad

In fiecare locație se vor desfășura următoarele activități: o conferinta de presa, o cladire iluminata in culoarea rosie in seara de 24 martie 2020, un eveniment stradal si de informare catre publicul larg. Suplimentar, in fiecare judet, sunt propuse evenimente conexe cum ar fi: ateliere, concursuri, flashmob, expozitie stradala etc.

Planificarea campaniei din Bucuresti si realizarea intalnirilor de coordonare cu Ministerul Sanatatii, Institutul National de Sanatate Publica, Inst. Marius Nasta si alte organizatii interesate.

Demararea procesului de asistenta tehnica pentru cele 5 judete in 3 directii:

- Asistenta tehnica (AT) pentru institutiile publice – suport pentru viitoarele strategii de dezvoltare,
- AT pentru ONG-urile de pacienti cu TB si TB-MDR – procese de dezvoltare organizationala si de planificare strategica,
- AT pentru ONG-urile interesate de problematica TB si HIV pentru scrierea si aplicarea la diferite finantari in vederea dezvoltarii unor proiecte sau servicii noi.

5.1.1 – Extinderea planului de advocacy construit în cadrul alocării anterioare, pentru a permite monitorizarea, raportarea și campaniile sistematice privind răspunsul guvernamental central și local la TBC și TB-HIV (politică, cadru legal, mecanisme financiare și cheltuieli reale, implementarea reformei, durabilitatea intervențiilor etc.) în contextul drepturilor populațiilor cheie și vulnerabile

5.1.1 - Scaling up the advocacy plan built under the previous allocation, to allow systematically monitoring, reporting and campaigning over central and local governmental response to TB and TB-HIV (policy, legal framework, financial mechanisms and real spending, implementation of reform, sustainability of interventions, etc.) in the context of the rights of key and vulnerable populations


Centru medico-social pentru grupuri vulnerabile

UPDATE Q5

- solicitare trimisa catre ASSMB ref. progres cladire Orzari – centru de servicii integrate
- solicitare RAA trimisă PMB pentru bugetarea centrului in bugetul PMB pentru anul 2020
- întâlnire organizată ASSMB & partenerii ref. la centrul de servicii integrate
- participare la realizarea studiului de fezabilitate pentru infiintarea centrului în locația din str. Orzari, așa cum a fost trimis tuturor partenerilor in decembrie 2019

PLANIFICARE Q6

- Studiul de fezabilitate va fi predat de firma catre ASSMB, apoi urmeaza procedurile de avizare, proiectare, executie;
- Solicitare ASSMB ref. stadiu proiect centru.



5.1.1 - Scaling up the advocacy plan built under the previous allocation, to allow systematically monitoring, reporting and campaigning over central and local governmental response to TB and TB-HIV (policy, legal framework, financial mechanisms and real spending, implementation of reform, sustainability of interventions, etc.) in the context of the rights of key and vulnerable populations

Health Advocacy School

UPDATE Q5

- Contributie la organizarea si derularea primului curs post-universitar de advocacy pentru sanatate la UMF “Carol Davila” Bucuresti (prima grupa de cursanti a finalizat cursul in noiembrie 2019, a doua este planificata pentru luna martie 2020)
- Pregatirea vizitei de studiu pentru participantii la curs, organizata impreuna cu TB Europe Coalition si Results UK la Londra programata pentru luna aprilie 2020



PLANIFICARE Q6

- Pregatirea continutului si logisticii vizitei de studiu (inclusiv contactare organizatii-gazda si speakeri, organizare deplasare grup etc.)
- Organizarea si derularea celui de-al doilea curs, in martie 2020

5.1.1 - Scaling up the advocacy plan built under the previous allocation, to allow systematically monitoring, reporting and campaigning over central and local governmental response to TB and TB-HIV (policy, legal framework, financial mechanisms and real spending, implementation of reform, sustainability of interventions, etc.) in the context of the rights of key and vulnerable populations

Rapoarte Watchdog

UPDATE Q5

- Contractate integral, in lucru

PLANIFICARE Q6

- Publicare rapoarte watchdog si advocacy

Activitati generale

UPDATE Q5

- Solicitare și intalnire Ministru Victor Costache ref. stadiul avizarii Normelor Legii 320/2018 privind măsurile de control al tuberculozei si Planului National Strategic HIV/SIDA
- Intalniri organizate cu echipa de advocacy, stabilire atributii
- Comunicare pe pagina de Facebook RAA si "Stop TB Ro" ref. la subiectele incluse in planul de advocacy

PLANIFICARE Q6

- Campania 24 martie 2020 – "Ziua Mondiala de Lupta Impotriva Tuberculozei", in 5 judete + Bucuresti

Activitati in derulare facilitate de Fundatia RAA pentru
Ministerul Sanatatii

CONTEXT: RAA este responsabilă cu selectarea și contractarea consultanților naționali pentru a sprijini implementarea următoarelor activități:

- 1.2.2 Evaluarea SNCT 2015 – 2020 urmată de revizuirea și extinderea SNCT până în 2025/2030
- 1.3.1. Consolidarea capacității de achiziții a MS și PNPSCT
- 1.4.1. Dezvoltarea unui cadru national de M&E pentru controlul tuberculozei
- 1.5.1. Stabilirea de legături funcționale între MS și ONG-uri active în domeniu
- 2.1.1. Elaborarea / revizuirea legislației secundare și a procedurilor operationale pentru asigurarea accesului real al populației cheie la servicii de prevenire și tratament eficace
- 3.4.1. Pregătirea și implementarea reformei de îngrijire ambulatorie în domeniul tuberculozei.

Asistenta tehnica nationala

- 1.3.1 – Cresterea capacitatii de achizitii a MS si PNPSCT
 - AT in derulare si planificate:
 - Analiza critica a sistemului de achizitie a medicamentelor si testelor de diagnostic pentru programul TB - FINALIZATA in 15 nov. 2019
 - Urmeaza in Q6 propunerile de modificari legislative pe baza recomandarilor agreate de MS (amanate din motive ce tin de organizarea MS)
 - De asemenea, urmeaza in Q6 – Q7 AT legata de procedura de cuantificare a necesarului de medicamente si planul national de achizitii pentru medicamentele anti-TB.

Asistenta tehnica nationala

1.5.1. Subcontractarea ONG

CONTEXT, CALENDAR INITIAL:

- În vederea desfășurării proiectului-pilot cu privire la implementarea Programelor Naționale de Sănătate cu sprijinul ONG, s-a identificat procedura proprie a MS de achiziție publică de servicii sociale: "Servicii de intervenție în stradă pentru persoane fără adăpost, persoane cu diferite adicții, victime ale violenței în familie, victime ale dezastrelor naturale etc - echipe mobile".
- Pachetul de documente pentru achiziție (procedura de consultare a pieței MoH, anunțul procedurii de consultare a pieței, raportul de necesitate MoH, anunțul de achiziție al MoH, cerințele tehnice / Caiet de sarcini, procedura de contractare, modelul de contract) a fost discutat cu MS în perioada sept. 2019 – ianuarie 2020. Varianta finală a fost depusă de consultant la MS la începutul lunii ianuarie 2020.

Calendarul agreat initial cu MS:

- 04.11.2019 - Proiect "Procedura achiziție servicii sociale ("echipe mobile)" - transmis MS și INSP pentru feedback;
- **02.12.2019** - MS va lansa procedura de consultare a pieței pentru identificarea costurilor cu serviciile de "echipe mobile" - intrucat nu exista aprobat standard minim de cost;
- **27.01.2020** - Lansarea oficială a achiziției de către MS;
- 01.04 - 31.12.2020 - Derularea serviciilor sociale de către ofertantul câștigător.

Termenele mentionate cu rosu nu au fost respectate din motive ce tin de organizarea/functionarea MS in perioada respectiva.

Asistenta tehnica nationala

• 1.5.1. Subcontractarea ONG

UPDATE Q5

- Programarea achiziției a fost revizuita si agreata cu MS:
 - **17 ianuarie 2020** - MS trebuia să deruleze procedura privind consultarea de piață privind prețurile și documentația pentru costul unitar al serviciului / beneficiar (etapa neinceputa)
 - **6 februarie** - MS ar fi trebuit sa obțină informațiile de la operatorii interesați;
 - 13 februarie – Consultant: finalizarea documentației (in fc de informațiile obținute la etapa anterioară);
 - 17 februarie – MS: finalizarea documentației de licitație;
 - 19 februarie- MS: lansarea licitației;
 - 2 martie – MS: evaluarea ofertelor;
 - 30 martie – MS: semnarea contractului.
 - 01 aprilie- 31 decembrie- derularea contractului

Termenele cu rosu nu au fost respectate din motive ce tin de organizarea/ functionarea MS in perioada respectiva

Asistenta tehnica nationala

2.1.1 - Analiza barierelor care impiedica accesul real al populatiilor cheie si vulnerabile la servicii de prevenire și tratament pentru TB, HIV

- **Stadiu: Finalizata, transmisa MS si INSP in Q5.**
 - RAA a solicitat managerului programului organizarea de catre MS a unei intalniri cu CNAS pentru discutarea si agrearea recomandarilor care vor fi transpuse in acte normative (pending).
 - In baza deciziei MS-CNAS consultantii nationali vor elabora propunerile de revizuire a actelor normative.

Asistenta tehnica nationala

- 2.1.1 - Proiectul de Norme metodologice pentru Legea TB 302/2018

Stadiu: Finalizat, transmis la MS in Q5

- Propunerile de acte normative au fost elaborate și transmise la MS la jumătatea lunii octombrie 2019 (conform contractelor de consultanță).
- Consultanții au primit feedback de la MS în lunile noiembrie și decembrie 2019, astfel încât, variantele finale au fost prezentate astfel:
 - la sfârșitul lunii noiembrie 2019 (normele privind indemnizația lunara de hrană)
 - la sfârșitul lunii decembrie 2019 (norme de asigurări sociale)
 - începutul lunii ianuarie 2020 (normele CNI / CCM).
- **Status actual: proiectele se află în procedura de avizare internă a MS.**
 - *O normă din domeniul asigurărilor sociale (respectiv prelungirea concediului și indemnizației pentru incapacitate de muncă) - a fost înaintată de MS printr-o Ordonanță emisă în data de 04.02.2020) - la momentul actual nu se cunoaște statusul acestei ordonanțe (dacă este sau nu valabilă)*

Asistenta tehnica nationala

- 3.4.1. Pregătirea și implementarea reformei de îngrijire ambulatorie în domeniul tuberculozei

Stadiu: Consultantii nationali recrutati au finalizat in Q5 elaborarea metodologiei pentru implementarea proiectului pilot. In prezent, proiectul pilot este in implementare.



Suplimentar, in baza aprobarii FPM, RAA a furnizat suport (financiar, achizitii si logistica) pentru:

- organizarea sesiunilor de instruire a personalului medical din site-urile pilot
- designul si tiparirea materialelor necesare implementarii pilotului



Asistenta tehnica nationala

A 1.2.2 Evaluarea SNCT 2015 – 2020 urmată de revizuirea și extinderea SNCT până în 2025/2030

și

A 1.4.1. Dezvoltarea unui cadru national de M&E pentru controlul tuberculozei

- Stadiu Q5: RAA a contractat echipa de consultanti nationali care au participat la intalnirile de lucru cu echipele OMS, INSP, MS si au lucrat la realizarea livrabilelor aferente celor doua activitati.

Optima HIV

Ce este: Un studiu care se bazează pe analiză secundară de date epidemiologice și financiare și modelare matematică.

Întrebări la care răspunde:

- Care este traiectoria așteptată a epidemiei cu HIV în România, dacă se păstrează același volum și aceeași structură a investițiilor în programul HIV/SIDA?
- Cum pot fi alocate optim resursele existente pentru atingerea până în 2030 a țintelor 90-90-90?
- Ce nivel de resurse este necesar pentru a atinge până în 2030 țintele 90-90-90?

Rezultat așteptat: Propunere de politică publică privind organizarea și finanțarea optimă a măsurilor din programul HIV/SIDA.

Beneficiu secundar: algoritmul pentru analiză și proiecțiile din Optima HIV poate fi oricând reutilizat în scopul planificării programului HIV/SIDA.

Implementatori: **Insistutul Național de Boli Infecțioase “Prof. Dr. Matei Balș”**, cu suport tehnic din partea Burnet Institute (Australia).

Finațare: Global Fund și UNAIDS, prin Fundația Romanian Angel Appeal.

Durață: Aprilie 2018 – Ianuarie 2020

UPDATE Q5: Studiul OPTIMA HIV este in lucru si va fi finalizat in Q6.

Suport in implementarea grantului

In Q5 RAA a furnizat suport MS in implementarea grantului, astfel:

- Administrarea unui numar de 36 contracte de asistenta tehnica aferente activitatilor aflate in coordonarea MS
- Participare la si suport in organizarea misiunilor de AT nationala
- Suport financiar si achizitii servicii pt. organizarea workshopului din 22 Octombrie cu stakeholderii nationali (reforma sistemului de achizitii pentru medicamentele anti-TB) si pentru organizarea sesiunilor de formare si realizarea materialelor tiparite pentru implementarea pilotului de ambulatory care
- Pregatirea propunerii de realocare a bugetului trimisa de MS catre FG (ultima varianta trimisa in decembrie 2019) incl. calcularea bugetului aferent MS pentru realocarea depusa, in conformitate cu nevoile actuale (inclusiv cautarea de oferte cf. cerintelor FG); RAA a raspuns cerintelor de clarificare formulate de LFA cu privire la sumele realocate;
- Pregatire diverse drafturi comunicari/documente pentru diferite activitati aflate in coordonarea MS.

Rata de absorbtie a fondurilor contractate de RAA pentru perioada Q1 – Q5

Explicatii	Sume	Rata de absorbtie
Buget aprobat Q1 -Q5	1,606,254.94 €	
Cheltuieli efectuate Q1-Q5	729,551.28 €	46%
Economii realocate catre trimestre viitoare, introducerea de noi activitati si catre PR (conform cererii de rallocare trimisa catre FG)	98,176.51 €	6%
Obligatii contractuale (conform definitiei FG - contracte semnate, in derulare)	373,467.70 €	23%
Total sume justificate (cheltuieli + realocari + contracte)	1,201,195.49 €	75%
Cheltuieli/ activitati amanate (buget - sume justificate care vor fi platite in urmatoarea perioada)	405,059.46 €	25%

Rata de absorbtie a fondurilor contractate de RAA pentru perioada Q1 – Q5 (*continuare*)

- **Daca aparent rata de cheltuire a bugetului aprobat este de doar 46%, in realitate, bugetul RAA pentru aceasta perioada este justificat in proportie de 75%.**
 - Economiiile RAA au fost identificate si realocate catre noi activitati (de ex. studiul OPTIMA HIV, training si tiparitari pilot ambulatory care) sau catre bugetul PR-lui in cerera de realocare trimisa catre FG.
 - Din cauza semnarii cu intarziere de aproape 5 luni a grantului, semnarii cu intarziere a MOU cu WHO s.a.m.d. si inceperii cu intarziere a misiunilor de asist. tehnica, mare parte din contractele de asistenta tehnica nationala au inceput mult mai tarziu decat fusesera preconizate si bugetate (Q1-Q2). Dar contractele sunt semnate, iar livrabilele sunt in diferite stadii de realizare. Aceste obligatii contractuale reprezinta **23%** din bugetul aprobat al RAA si vor fi finalizate in decursul acestui an.
